



Umfang BA 1:

- Lernatelier 2 (Nord-West)**
- Lernatelier 3 (Nord- Ost)**
- Modernisierung Chemiebereich**

Kostenübersicht BA 1 - Zusammenfassung

	[€, brutto]
Gesamtkosten BA 1	
BT 1 Lernatelier 2	282.000,00 €
BT 2 Lernatelier 3	224.000,00 €
BT 6.1 Chemie	436.800,00 €
BT 7.1 Abstellr.	42.000,00 €
 Zwischensumme:	 984.800,00 €
 Vorweggenommene Leistungen BA 2 + 3 (Leistungen fallen in BA 2 + 3 nicht mehr an)	
Ausstattung Chemie Vorbereitung	33.082,00 €
GLT (Programmierung)	18.800,00 €
 BA 1 - Kostenberechnung	 1.037.000,00 € incl. 3% Unwägbarkeiten
 BA 1 - Kostenanschlag nach LV Paket 01	 1.037.000,00 € Unwägbarkeiten 5.000,- €

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 1 - 2016
Gewerk:	039 TROCKENBAUARBEITEN	
Submission:	2016 06 07	Uhr: 15:15

Ausschreibungsart: öffentlich
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe
 Eingegangene Angebote: 5 wertbare Angebote: 4

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Wände und Vorsatzschalen
 Titel 02 Abgehängte Decken
 Titel 03 Brandschutzkonstruktionen
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:			
15190_039	Trockenbauarbeit.	BT 1	45.404,16 €
		BT 2	37.119,55 €
		BT 6.1	28.505,36 €
		BT 7.1	9.330,74 €
	zuzüglich:		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		120.359,81 €
	MwSt.	19%	22.868,36 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	143.228,17 €
Vergabesumme		brutto	124.901,88 €
Unterdeckung / Überdeckung:			18.326,29 €
Prozentual:			14,67%

VERGABEVORSCHLAG: MB Stuckateur GmbH
 88677 Markdorf

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 1 - 2016
Gewerk:	075 BES. EINBAUTEN - LABOR AUSSTATTUNG CHEMIE	
Submission:	2016 06 01	Uhr: 15:30

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 6
 Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Ausstattung R. 138 Chemie Übung
 Titel 02 Ausstattung R. 139 Chemie Vorbereitung / Sammlung
 Titel 03 Lose Möblierung Chemie
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:			
15190_075	Laborausstattung	BA 6.1	91.329,52 €
15190_600	Lose Möblierung	BA 6.1 (Chemie)	11.120,00 €
	zuzüglich: Umplanung Chemie Vorbereitung - Ausstattung aus R. 137 in R. 139 vorgesehen (wg. Bauabschnitte + Nutzung) Änderung nach Besprechung v. 2016 03 10. Leistungen aus BA 2 vorgezogen - keine Änderung Gesamtkosten		27.800,00 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto	130.249,52 €
		MwSt. 19%	24.747,41 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	154.996,93 €
Vergabesumme		brutto	154.671,21 €
Unterdeckung / Überdeckung:			325,72 €
Prozentual:			0,21%

VERGABEVORSCHLAG: Laborbausysteme Hemling GmbH & Co. KG
 48683 Ahaus

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI		
Gewerk:	052 ELEKTROINSTALLATION		
Submission:	07.06.2016	16.30	Uhr

Ausschreibungsart: öffentlich
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Elektroarbeiten das Lernatelier 2
 Elektroarbeiten das Lernatelier 3
 Elektroarbeiten für den NaWi-Bereich Chemie

Maßnahmen für die Unterhaltung,
 wie z.B. Auflagen aus der Brandverhütungsschau und
 Erweiterung WLAN

Angebotssummen: siehe Preisspiegel

KOSTENANSATZ :

KOSTENGRUPPE:			
	Kostenberechnung		59.167,00 €
	Zusätzliche Maßnahmen zur Unterhaltung die mit ausgeschrieben wurden		77.138,00 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		136.305,00 €
	MwSt.	19%	25.897,95 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:	brutto		162.202,95 €
VERGABESUMME	brutto		177.988,38 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-15.785,43 €
Prozentual:			-8,87%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Steidle
 Überlingerstraße 15
 88682 Salem-Tüfingen

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI		
Gewerk:	041 LÜFTUNGSANLAGEN		
Submission:	01.06.2016	16.15	Uhr

Ausschreibungsart: beschränkt
 Eingegangene Angebote: 2 wertbare Angebote: 2

Ausgeschriebene Leistungen: Lüftungsbauarbeiten Lernatelier 2
 Lüftungsbauarbeiten Lernatelier 3
 Lüftungsbauarbeiten naturwissenschaftlicher Bereich Chemie

Angebotssummen: siehe Preisspiegel

KOSTENANSATZ :

KOSTENGRUPPE:			
Kostenberechnung			105.775,80 €
KOSTENBERECHNUNG :	netto		105.775,80 €
	MwSt.	19%	20.097,40 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:			brutto
			125.873,20 €
VERGABESUMME			brutto
			109.394,30 €
Unterdeckung / Überdeckung:			16.478,90 €
Prozentual:			15,06%

VERGABEVORSCHLAG: Fa. Feurer GmbH & Co. KG
 Gartenstraße 30
 88512 Mengen

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 1 - 2016
Gewerk:	003 ABRUCHARBEITEN	
Submission:	2016 06 27	Uhr: 14:30

Ausschreibungsart: beschränkt
 Aufforderungen zur Angebotsabgabe: 2
 Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen:
 Titel 01 Baustelleneinrichtung
 Titel 02 Abbrucharbeiten
 Titel 03 Rohbauarbeiten
 Titel 04 Tagelohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
 siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:			
15190_003	Abbrucharbeiten	BA 1	17.899,89 €
		BA 2	15.978,82 €
		BA 6.1	12.228,63 €
		BA 7.1	3.267,84 €
	enthalten f. TGA: Abbruch TGA HLS (=Angebot günst. Bieter; in KB in KG 400)		
	Abbruch TGA E (=Angebot günst. Bieter; in KB in KG 400)		
	14.446,00 €, netto / 17.190,74 €, brutto		
KOSTENBERECHNUNG :	netto		49.375,18 €
	MwSt.	19%	9.381,28 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto	58.756,46 €
Vergabesumme		brutto	74.245,11 €
Unterdeckung / Überdeckung:			-15.488,65 €
Prozentual:			-20,86%

VERGABEVORSCHLAG: Kurt Hinder GmbH
 88339 bad Waldsee

Kostenübersicht Gesamtprojekt - Zusammenfassung

Stand 2016|07|01

[€, brutto]

BA 1 - Kostenanschlag nach LV Paket 01	1.037.000,00 €	Unwägbarkeiten 5.000,- €
BA 2 - Kostenberechnung 2015 09 20	863.000,00 €	incl. 3% Unwägbarkeiten
BA 3 - Kostenberechnung 2015 09 20	814.000,00 €	incl. 3% Unwägbarkeiten
PROJEKTKOSTEN GESAMT	2.714.000,00 €	

Zeitplan BA 1:

Lernatelier 2 (Nord-West)

08 – 10 / 2016


Lernatelier 3 (Nord- Ost)

09 – 11 / 2016

Modernisierung Chemiebereich

08 – 12 / 2016

28	BAUBEGINN BA 1	0 Tage	Mo 25.07.16	Mo 25.07.16
29	BAUSFÜHRUNG Lernatelier 02	65 Tage	Mo 25.07.16	Mo 24.10.16
30	003 Rückbau / Abbruch	10 Tage	Mo 25.07.16	Fr 05.08.16
31	041 Installation Lüftungskanäle	10 Tage	Mo 08.08.16	Fr 19.08.16
32	TGA Rohinstallatione	10 Tage	Mo 08.08.16	Fr 19.08.16
33	039 Trennwände / Türen ...	15 Tage	Mo 22.08.16	Fr 09.09.16
34	039 Abgehängte Decken	5 Tage	Mo 12.09.16	Fr 16.09.16
35	034 Maler / Oberflächen	10 Tage	Mo 19.09.16	Fr 30.09.16
36	TGA Fertiginstallatione	5 Tage	Mo 26.09.16	Fr 30.09.16
37	036 Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Di 04.10.16	Mo 17.10.16
38	033 Baureinigung	5 Tage	Di 18.10.16	Mo 24.10.16
39				
40	BAUSFÜHRUNG Lernatelier 03	65 Tage	Mo 08.08.16	Di 08.11.16
41	003 Rückbau / Abbruch	10 Tage	Mo 08.08.16	Fr 19.08.16
42	041 Installation Lüftungskanäle	10 Tage	Mo 22.08.16	Fr 02.09.16
43	TGA Rohinstallatione	10 Tage	Mo 22.08.16	Fr 02.09.16
44	039 Trennwände / Türen ...	15 Tage	Mo 05.09.16	Fr 23.09.16
45	039 Abgehängte Decken	5 Tage	Mo 26.09.16	Fr 30.09.16
46	034 Maler / Oberflächen	10 Tage	Di 04.10.16	Mo 17.10.16
47	TGA Fertiginstallatione	5 Tage	Di 11.10.16	Mo 17.10.16
48	036 Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Di 18.10.16	Mo 31.10.16
49	033 Baureinigung	5 Tage	Mo 02.11.16	Di 08.11.16
50				
51	BAUSFÜHRUNG Chemie	93 Tage	Mo 01.08.16	Fr 09.12.16
52	003 Rückbau / Abbruch	10 Tage	Mo 01.08.16	Fr 12.08.16
53	041 Installation Lüftungskanäle	10 Tage	Mo 15.08.16	Fr 26.08.16
54	TGA Rohinstallatione	10 Tage	Mo 15.08.16	Fr 26.08.16
55	039 Trennwände / Türen ...	15 Tage	Mo 29.08.16	Fr 16.09.16
56	039 Abgehängte Decken	5 Tage	Mo 19.09.16	Fr 23.09.16
57	034 Maler / Oberflächen	14 Tage	Mo 26.09.16	Fr 14.10.16
58	TGA Fertiginstallatione	5 Tage	Mo 10.10.16	Fr 14.10.16
59	036 Bodenbelagsarbeiten	10 Tage	Mo 17.10.16	Fr 28.10.16
60	076 Ausstattung NAWI	24 Tage	Mo 31.10.16	Fr 02.12.16
61	033 Baureinigung	5 Tage	Mo 05.12.16	Fr 09.12.16

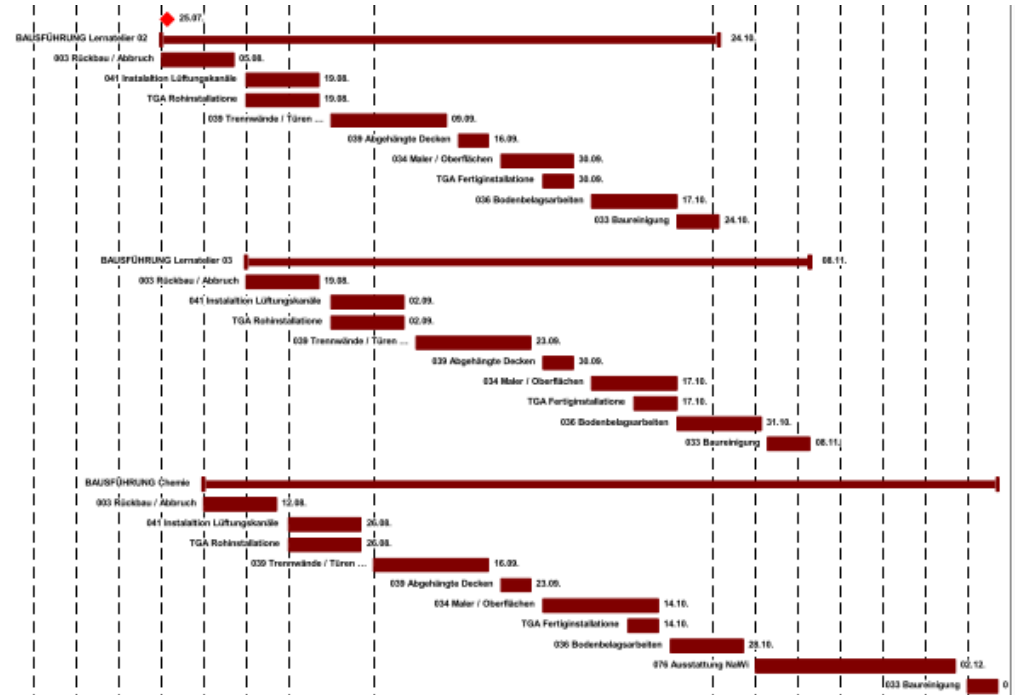



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
